

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI TECNICI  
DA LABORATORIO PER IL NUOVO  
CRU\_CENTRO RICERCA UNIVERSITARIA




UNIVERSITA' DI CAMERINO  
AREA EDILIZIA MANUTENZIONI E  
SICUREZZA

Responsabile Unico del Procedimento:  
Ing. Gian Luca Marucci

Coordinamento Progetto:  
prof. Graziano Leoni

Progettazione:  
geom. Bruno Mogliani

Collaboratori:  
ing. Cristiano Bordo  
geom. Irene Pisani  
ing. Matteo Carnevali

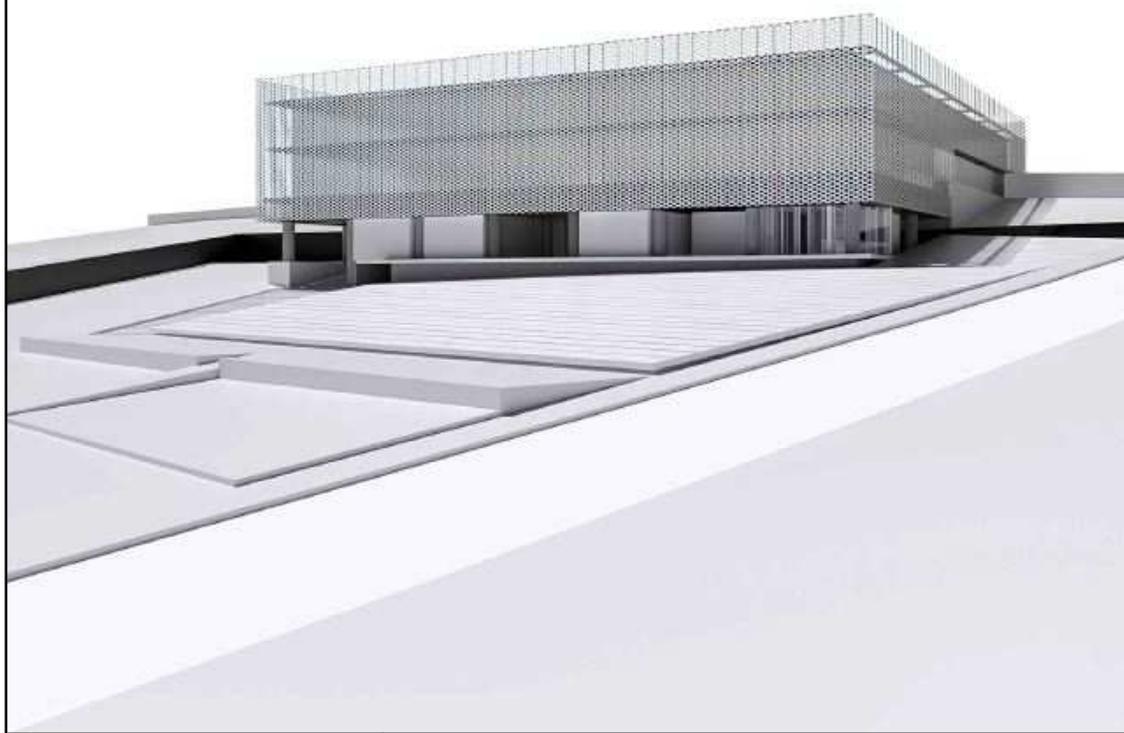

**F**

ELABORATO:

0 0 4 (0)

Progetto esecutivo

**Sicurezza**

Cronoprogramma dei lavori - diagramma di Gantt

SCALA

24.06.2020

# ALLEGATO "A"

**Comune di Camerino**  
Provincia di MC

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di arredi tecnici per il nuovo Centro di Ricerca Universitario

**COMMITTENTE:** Università degli Studi di Camerino.

**CANTIERE:** Località Madonna delle Carceri, Camerino (MC)

Camerino, 24/06/2020

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(Geometra Pisani Irene)



**Geometra Pisani Irene**

Via del Bastione n. 16  
62032 Camerino (MC)  
Tel.: 0737.402044 - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$  
E-Mail: irene.pisani@unicam.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Dic 20		14 Dic 20					21 Dic 20					28 Dic 20							
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Preparazione del cantiere</b>	9 g																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1																			
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipol	6 g	Z1																			
<b>Scarico merce</b>	53 g																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	8 g	Z1																			
Copia di Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei n	8 g																				
Copia di Copia di Allestimento di depositi, zone per lo stoccaç	8 g																				
<b>Montaggio cappe</b>	42 g																				
Montaggio di cappe chimiche	42 g	Z1																			
<b>Montaggio di banconi chimici</b>	21 g																				
Montaggio di banconi chimici	21 g																				
Montaggio di banconi chimici con lavello	21 g																				
<b>Montaggio di tavoli e armadi</b>	11 g																				
Montaggio di tavoli	10 g																				
Montaggio di tavoli rinforzati	10 g																				
Montaggio di armadi combinati	7 g																				
<b>Istallazione di apparecchiature</b>	5 g																				
Frigocongelatore	5 g																				
Lavavetriere per laboratorio	5 g																				
Produttore di ghiaccio	5 g																				
Ultracongelatore verticale	5 g																				
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	2 g																				
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g																				
Smobilizzo del cantiere	2 g																				
<b>LEGENDA Zona:</b>																					
Z1 = ZONA UNICA																					

